



LOTE GRANDE
EMPREENDIMIENTOS

Relatório mensal de execução de obra
Março 2023

Obra: HOSPITAL UNIMED FOZ DO IGUAÇU – VITA VILLAGE
EMPREENDIMIENTOS LTDA

Rua Élcio Luís Cavalcante, Vita Village,
Foz do Iguaçu/PR

1. Atividades Realizadas

1.1. Relação dos serviços

- Acabamentos - Fachada ACM
- Acabamentos - Granito - Bancadas - Térreo - Trecho 01 / 02
- Acabamentos - Granito - Pingadeiras - Térreo
- Acabamentos - Granito - Soleiras - Térreo - Trecho 01 / 02
- Acabamentos - Pele de Vidro
- Acabamentos - Pintura - Elevadores Sociais (98/99)
- Acabamentos - Pintura - Emassamento - Térreo - Trecho 02
- Acabamentos - Pintura - Parede e Teto - Térreo / Primeiro Pavimento - Trecho 01 / 03
- Acabamentos - Pintura - Selador - Primeiro Pavimento - Trecho 01 / 03
- Acabamentos - Pintura - Selador - Térreo - Trecho 01 / 02
- Acabamentos - Piso Porcelanato - Térreo - Trecho 01 / 03
- Acabamentos - Piso Vinílico - Instalação - Térreo - Trecho 01 / 02
- Acabamentos - Revestimento - Térreo - Trecho 03
- Drywall - Chapeamento - Parede e Teto - Térreo / Primeiro Pavimento - Trecho 01 / 03
- Drywall - Chapeamento - Primeiro Pavimento - Trecho 01 / 02 / 03
- Drywall - Chapeamento - Subsolo - Trecho 01
- Drywall - Chapeamento - Térreo - Trecho 02 / 03
- Drywall - Estruturação - Subsolo - Trecho 01
- Drywall - Estruturação Forro - Térreo - Trecho 01 / 02
- Estrutura - Locação de Fundação - Guarita
- Estrutura - Locação de Fundação - Muro de Divisa
- Estrutura - Metálica - Cobertura
- Estrutura - Metálica - Elevadores
- Estrutura - Perfuração de Estacas Mecanizadas - Subsolo
- Estrutura - Remoção de Escoramento - Central de Utilidades
- Estrutural - Concretagem - Central de Utilidades
- Estrutural - Concretagem - Fundação - Guarita
- Estrutural - Concretagem - Fundação - Muro de Divisa
- Estrutural - Montagem de Estrutura Metálica - Suporte Elevadores
- Estrutural - Montagem de Forma - Fundação - Central de Utilidades
- Estrutural - Montagem de Forma - Fundação - Guarita
- Fechamento - Levante - Bloco de Concreto - Primeiro Pavimento - Escada de Emergência

- Fechamento - Levante - Blocos Cerâmicos - Guarita
- Fechamentos - Levante - Bloco de Concreto - Primeiro Pavimento - Trecho 01
- Fechamentos - Reboco Externo - Caixa d'Água
- Fechamentos - Reboco Externo - Trecho 01 / 03
- Fechamentos - Reboco Interno - Escada de Emergência
- Impermeabilização - Térreo / Primeiro Pavimento - Trecho 01
- Instalações - Alarme - Térreo - Trecho 02
- Instalações - Cabeamento - Primeiro Pavimento - Trecho 03
- Instalações - Cabeamento - Térreo - Trecho 01 / 03
- Instalações - Climatização - Rede Frigorígena
- Instalações - Elétrica - Cabeamento - Trecho 02
- Instalações - Elétrica - Primeiro Pavimento - Trecho 01 / 03
- Instalações - Elétrica - Subsolo - Trecho 01
- Instalações - Elétrica - Térreo - Trecho 01 / 02
- Instalações - Esgoto e Águas Pluviais- Áreas Externas
- Instalações - Gases Medicinais - Gases Salas Cirúrgicas
- Instalações - Hidráulica - Primeiro Pavimento - Trecho 01 / 03
- Instalações - Hidráulica - Subsolo - Trecho 01
- Instalações - Incêndio - Térreo - Trecho 01
- Instalações - Passagem de Cabeamento - Térreo / Primeiro Pavimento
- Instalações - Quadro Elétricos - Térreo / Primeiro Pavimento
- Instalações - Rede de Dutos - Térreo - Trecho 01 / 03
- Instalações - Rede de Hidrantes - Subsolo / Térreo / Primeiro Pavimento
- Terraplanagem - Regularização Central de Utilidades

1.2. Relação de empreiteiros que trabalharam no período:

- AAC AR CONDICIONADO LTDA
- ADRIANE DE SOUZA GONÇALVES EIRELI
- ALVARO MARI & CIA LTDA
- ANDAIMES TIBAGI LTDA
- CONSERGE CONSTRUÇÕES E ICORPORAÇÕES LTDA
- CONSTRUTORA INSTALADORA MONTER LTDA
- CRJ COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
- DJ DE SANTANA OBRAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- DJ ALVES EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
- ENCLIVEL CLIMATIZAÇÕES
- FERREIRAS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
- FRANÇA E CANEPPELE LTDA
- J.S. CONSTRUTORA LTDA
- JEFFERSON DOMINGOS LÚCIO - IMPERMEABILIZAÇÕES
- L DA SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
- M.H. CAMARGO DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES
- MUNCKFOZ MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
- ROBSON DIAS BATISTA - (LOCACOES IDEAL)
- OXICHAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
- PACHLA E PACHLA LTDA - (ARQVIDROS)
- WEGA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO – EIRELI - ME

4. Imagens da obra



Foto 1 – Fachada em ACM e Pele de Vidro – Fachada Principal



Foto 2 – Fachada em ACM e Pele de Vidro – Fachada Principal



Foto 3 – Fachada em ACM e Pele de Vidro – Fachada Principal



Foto 4 – Instalações em Granito – Soleiras / Pingadeiras e Bancadas



Foto 5 – Instalações em Granito – Soleiras / Pingadeiras e Bancadas



Foto 6 – Instalações em Granito – Soleiras / Pingadeiras e Bancadas



Foto 7 – Execução de Selador, Emassamento e Pintura



Foto 8 – Execução de Selador, Emassamento e Pintura



Foto 9 – Execução de Selador, Emassamento e Pintura



Foto 10 – Execução de Selador, Emassamento e Pintura



Foto 11 – Instalação de Piso Cerâmico e Vinílico



Foto 12 – Instalação de Piso Cerâmico e Vinílico



Foto 13 – Instalação de Piso Cerâmico e Vinílico



Foto 14 – Instalação de Piso Cerâmico e Vinílico



Foto 15 – Estrutural – Concretagem da Central de Utilidades



Foto 16 – Estrutural – Preparo de Base para Piso de Concreto



Foto 17 – Estrutural – Fundação Guarita



Foto 18 – Instalações – Rede de Hidrantes



Foto 19 – Instalações – Rede Elétrica

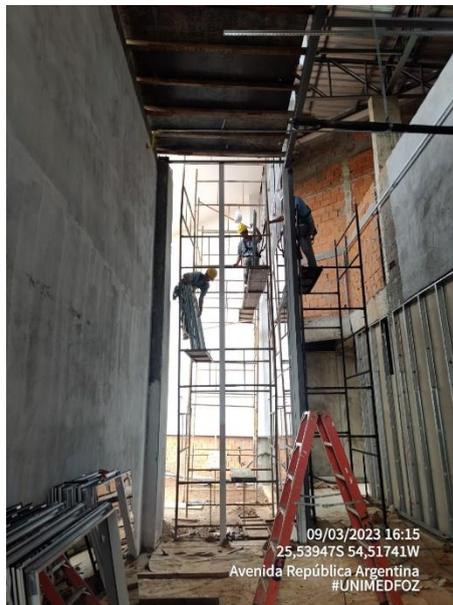


Foto 20 – Estruturação – Pele de Vidro

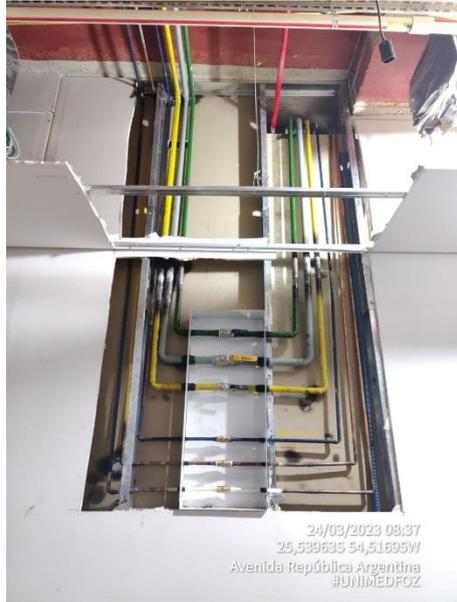


Foto 21 – Instalações – Rede de Gases Medicinais

2. Acompanhamento do cronograma

2.1. Previsto x Realizado:

2.2. Metas importantes para o mês:

- Piso Vinílico
- Esquadrias Metálicas

2.3. Fatores ofensores ao cumprimento das metas:

- Incompatibilidades e interferências entre os projetos;
- Atraso na entrega de materiais;
- Condições climáticas.

2.4. Curva S

3. Controle pluviométrico mensal

Condições meteorológicas no mês de Março 2022.

PLUVIOMÉTRICO MARÇO 2020			
Dia	mm	Dia	mm
1	-	17	-
2	-	18	-
3	-	19	-
4	<i>89.60mm</i>	20	-
5	-	21	-
6	-	22	-
7	-	23	-
8	-	24	-
9	<i>1.80mm</i>	25	-
10	<i>5.20mm</i>	26	<i>1.20mm</i>
11	-	27	-
12	-	28	-
13	-	29	-
14	<i>37.80mm</i>	30	<i>8.40mm</i>
15	<i>18.20mm</i>	31	-
16	<i>16.80mm</i>		

Fonte: <https://mapas.inmet.gov.br/> - Entidade: CEMADEN – D2744
